

Im Ausschuss schlussgemeldet werden

1.

2.



Objekt	K7725 Ailingen - Ittenhausen	038 Tannenhagschule
Projekt	16-025-000 Querungshilfe Ittenhauser Straße	Nachrüstung sommerlicher Wärmeschutz
Finanzposition (alt)	2.6500.9500.000-0520	2.2711.9429.000-0008
PSP-Element (neu)	7.54200000T1001	7.21200300H0382
GR Beschluss	05.06.2018	
Baubeschluss		24.07.2017
Grundsatz OB		
Grundsatz EBM		
Gesamtkosten gem Beschluss	370.000,00 €	315.000,00 €
üpla Mittel		
Bereitgestellte HH- Mittel ges.	370.000,00 €	315.000,00 €
Kostenschätzung		
Kostenberechnung	370.000,00 €	347.000,00 €
Kostenanschlag		
Kostenfeststellung	316.832,91 €	251.054,46 €
Kostenüber-/unterschreitung		
gegenüber HH- Mittel gem. Beschluß	-53.167,09 €	-63.945,54 €
in Prozent +/-	-14,37%	-20,30%
gegenüber Gesamtfinanzierung	-53.167,09 €	-63.945,54 €
in Prozent +/-	-14,37%	-20,30%

3.




4.



Gebäude	084 Max-Grünbeck Haus	Rückbau und Sanierung Fallenbrunnen Nord- Ost
Projekt	Umnutzung der Büros zur VHS	Rückbau u. Sanierung Tankstelle FB 37
Finanzposition (alt)	2.0600.9420.000-0014	90011900/ 421120000
PSP-Element (neu)	7.11240100H0841	7.11330000S0002
GR Beschluss		29.04.2019
PBU Beschluss		17.09.2019
Baubeschluss		
Grundsatz OB	03.08.2016	
Grundsatz EBM		
Gesamtkosten gem Beschluss üpla Mittel	470.000,00 €	282.003,00 €
Bereitgestellte HH- Mittel ges.	470.000,00 €	282.003,00 €
Kostenschätzung	468.932,00 €	
Kostenberechnung	481.258,68 €	
Kostenanschlag	408.882,91 €	
Kostenfeststellung		294.039,29 €
Kostenüber-/unterschreitung		
gegenüber HH- Mittel gem. Beschluß in Prozent +/-	-61.117,09 € -13,00%	12.036,29 € 4,27%
gegenüber Gesamtfinanzierung in Prozent +/-	-61.117,09 € -13,00%	12.036,29 € 4,27%

5.

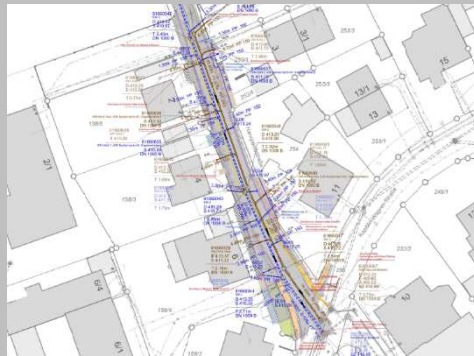

6.



Objekt	Hansjakobstraße	Veloring (Neubau Rad- und Gehweg)
Projekt	Straßenbau	16-008-000 Veloring BA 3/2 Bodenseecenter
Finanzposition (alt)	2.6300.9548.000-0008	2.6300.9506.000-0106
PSP-Element (neu)	2.6300.9502.000-0008	7.54100000T1102
PBU Beschluss	2.6300.9501.000-0008	03.11.2020
Baubeschluss	7.54100000S0001	26.08.2015
Eilentscheid OB	17.09.2019	
Verfügung EBM		
Gesamtkosten gem Beschluss üpla Mittel	275.000,00 €	680.000,00 €
Bereitgestellte HH- Mittel ges.	275.000,00 €	680.000,00 €
Kostenschätzung		
Kostenberechnung		
Kostenanschlag		
Kostenfeststellung	305.719,59 €	674.943,48 €
Kostenüber-/unterschreitung		
gegenüber HH- Mittel gem. Beschluß in Prozent +/-	30.719,59 € 11,17%	-5.056,52 € -0,74%
gegenüber Gesamtfinanzierung in Prozent +/-	30.719,59 € 11,17%	-5.056,52 € -0,74%

7.



8.



Objekt	Veloring (Neubau Rad- und Gehweg)	Veloring (Neubau Rad- und Gehweg)
Projekt	16-008-000 Veloring BA 4/1	16-009-000 Veloring BA 4/2 Aistegstraße
Finanzposition (alt)	2.6300.9507.000-0106	2.6300.9507.000-0106
PSP-Element (neu)	7.54100000T1103	7.54100000T1103
GR Beschluss	27.06.2016	21.03.2016
PBU Beschluss	03.11.2020	03.11.2020
Baubeschluss		
Eilentscheid OB	26.08.2015	
Verfügung EBM		
Gesamtkosten gem Beschluss üpla Mittel	560.000,00 €	515.000,00 €
Bereitgestellte HH- Mittel ges.	560.000,00 €	515.000,00 €
Kostenschätzung		
Kostenberechnung		
Kostenanschlag		
Kostenfeststellung	548.937,25 €	500.843,77 €
Kostenüber-/unterschreitung		
gegenüber HH- Mittel gem. Beschluß in Prozent +/-	-11.062,75 € -1,98%	-14.156,23 € -2,75%
gegenüber Gesamtfinanzierung in Prozent +/-	-11.062,75 € -1,98%	-14.156,23 € -2,75%

Im GR schlussgemeldet werden

9.

10.



Gebäude	083_02 Jugendzentrum Spielehaus	083_01 Jugendzentrum Molke
Projekt	Generalsanierung	Generalsanierung
Finanzposition (alt)	2.4600.9421.000-0008	2.4600.9420.000-0008
PSP-Element (neu)		
GR Beschluss		
Baubeschluss	22.07.2013	22.07.2013
Grundsatz OB		
Grundsatz EBM		
Gesamtkosten gem Beschluss	1.100.000,00 €	5.100.000,00 €
üpla Mittel	590.000,00 €	60.000,00 €
Bereitgestellte HH- Mittel ges.	1.690.000,00 €	5.160.000,00 €
Kostenschätzung	1.100.000,00 €	5.100.000,00 €
Kostenberechnung	1.437.381,89 €	4.773.142,01 €
Kostenanschlag	1.648.851,31 €	5.245.926,48 €
Kostenfeststellung	1.623.228,17 €	5.135.595,61 €
Kostenüber-/unterschreitung		
gegenüber HH- Mittel gem. Beschluß	523.228,17 €	35.595,61 €
in Prozent +/-	47,57%	0,70%
gegenüber Gesamtfinanzierung	-66.771,83 €	-24.404,39 €
in Prozent +/-	-3,95%	-0,47%

11.



12.



Gebäude	024.04 Sporthalle Ailingen	069 Kita beim Klinikum
Projekt	Neubau	Sanierung
Finanzposition (alt)	2.5619.9410.000-0008	2.4652.9423.000-0001
PSP-Element (neu)	7.42412100H0241	7.36500101H0691
GR Beschluss		
Baubeschluss	05.05.2014	13.10.2014
Verfügung OB		
Grundsatz EBM		
Gesamtkosten gem Beschluss üpla Mittel	7.550.000,00 €	1.700.000,00 €
Bereitgestellte HH- Mittel ges.	7.550.000,00 €	1.700.000,00 €
Kostenschätzung	7.371.702,00 €	1.784.072,55 €
Kostenberechnung	7.481.291,35 €	1.671.933,22 €
Kostenanschlag	6.603.434,18 €	
Kostenfeststellung	6.599.512,82 €	1.666.051,78 €
Kostenüber-/unterschreitung		
gegenüber HH- Mittel gem. Beschluß in Prozent +/-	-950.487,18 € -12,59%	-33.948,22 € -2,00%
gegenüber Gesamtfinanzierung in Prozent +/-	-950.487,18 € -12,59%	-33.948,22 € -2,00%

13.



14.



Gebäude	080 Frei- und Seebad Fischbach	080 Frei- und Seebad Fischbach
Projekt	Neubau	Parkplatz und öffentlicher Vorbereich
Finanzposition (alt)	2.5730.9410.000-0001	2.6800.9502.000-0009
PSP-Element (neu)	7.42400200H0801	7.54600000T1001
GR Beschluss		
Baubeschluss	22.06.2015	22.06.2015
Grundsatz OB		
Grundsatz EBM		
Gesamtkosten gem Beschluss	13.621.000,00 €	680.000,00 €
üpla Mittel		
Bereitgestellte HH- Mittel ges.	13.621.000,00 €	680.000,00 €
Kostenschätzung	13.490.167,00 €	680.000,00 €
Kostenberechnung	13.621.000,00 €	680.000,00 €
Kostenanschlag		522.201,91 €
Kostenfeststellung	11.460.425,64 €	578.466,21 €
Kostenüber-/unterschreitung		
gegenüber HH- Mittel gem. Beschluß in Prozent +/-	-2.160.574,36 € -15,86%	-101.533,79 € -14,93%
gegenüber Gesamtfinanzierung in Prozent +/-	-2.160.574,36 € -15,86%	-101.533,79 € -14,93%

15.



16.



Objekt	Unterlottenweiler	KVP Ittenhausen
Projekt	Straßenbau Lottenweiler BA 1 und 2	Straßenbauarbeiten
Finanzposition (alt)	2.6300.9512.000-0508	2.6500.9501.000-0515
PSP-Element (neu)	7.54100000T1117	7.54200000T1002
GR Beschluss	23.07.2014	25.02.2019
Baubeschluss		
Grundsatz OB		
Grundsatz EBM		
Gesamtkosten	1.610.000,00 €	1.950.000,00 €
gem Beschluss		
üpla Mittel		
Bereitgestellte		
HH- Mittel ges.	1.610.000,00 €	1.950.000,00 €
Kostenschätzung		
Kostenberechnung	1.610.000,00 €	1.450.000,00 €
Kostenanschlag		
Kostenfeststellung	1.530.505,59 €	1.778.492,22 €
Kostenüber-/unterschreitung		
gegenüber HH- Mittel	-79.494,41 €	-171.507,78 €
gem. Beschluß		
in Prozent +/-	-4,94%	-8,80%
gegenüber	-79.494,41 €	-171.507,78 €
Gesamtfinanzierung		
in Prozent +/-	-4,94%	-8,80%

17.



Objekt	Karl-Maybach-Gymnasium, Schulhöfe Nord und Süd
Projekt	Neugestaltung Aussenanlagen
Finanzposition (alt)	2.2312.9503.000-0008
PSP-Element (neu)	7.21100602G0001
GR Beschluss	20.11.2017
Baubeschluss	
Grundsatz OB	
Grundsatz EBM	
Gesamtkosten gem Beschluss	1.320.000,00 €
üpla Mittel	
Bereitgestellte HH- Mittel ges.	1.320.000,00 €
Kostenschätzung	
Kostenberechnung	
Kostenanschlag	
Kostenfeststellung	1.314.585,39 €
Kostenüber-/unterschreitung	
gegenüber HH- Mittel gem. Beschluß	-5.414,61 €
in Prozent +/-	-0,41%
gegenüber Gesamtfinanzierung	-5.414,61 €
in Prozent +/-	-0,41%
